



BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

SAAMA DEDA

Ontwikkeling lagere school in wijk Medina in Abéné, Senegal

Projectplan fase 2

Stichting Bright Future for Children, Weert

Deelproject 2: Bouw 3 klaslokalen voor een lagere school in wijk Medina in Abéné, Senegal

Looptijd project: April 2020 t/m december 2020

Algemene informatie

Land :	Nederland (land projectuitvoering: Senegal)
Naam van de organisatie:	Stichting Bright Future for Children
Contact adres Stichting:	Houtstraat 14, 6001SJ Weert
Telefoonnummer:	06 51510474
E-mail :	info@brightfutureforchildren.nl
Website :	https://www.brightfutureforchildren.nl/
KvK:	71717463
ANBI:	De stichting is als ANBI aangemerkt.
Korte samenvatting project:	Het doel is om in de wijk Medina in Abéné (Zuid Senegal) een dubbel-stromige lagere school (12 klassen) te bouwen omdat de huidige lagere school van het dorp over onvoldoende capaciteit beschikt om aan de huidige en verwachte onderwijsvraag te kunnen beantwoorden. Het project wordt fasegewijs gerealiseerd.
Inhoud fase 1:	In de eerste fase (2019) werden 2 klaslokalen gebouwd.
Inhou fase 2:	In de 2 ^e fase (2020) worden 3 klaslokalen gebouwd.
Vooruitblik fase 3 en 4:	In de 3 ^e fase (2021) wordt een fundering gelegd voor 3 klassen en wordt minimaal 1 klaslokaal gebouwd. In de 4e fase (2022) wordt het project afgerond met de bouw van de laatste klaslokalen en een lerarenkamer.
Financiering project:	Het project wordt gefinancierd door Stichting Bright Future for Children op basis van inkomsten uit eigen acties, persoonlijke donaties en fondsenwerving.
Lokale partner:	Het project wordt in samenwerking met de vereniging DECASA gerealiseerd.
Bankdetails	
Bank:	Rabobank
IBAN:	NL 89 RABO 0330517708
Rekeninghouder:	Stichting Bright Future for Children



Regio Casamance in Zuid Senegal, met aanduiding projectlocatie Abéné

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Inhoudsopgave	3
1. Naam project	4
2. Achtergrond project	4
3. Probleemdefinitie	5
4. Probleemoplossing	5
5. Doelgroep	5
6. Projectrealisatie	5
7. Projectplan: activiteiten, begroting, projectplanning, financieringsplan	6
8. Projectorganisatie, informatievoorziening en controle	7
9. Projectcontrole	8
Bijlage:	
Kostenraming 3 klaslokalen	9

1. Naam van project.

SAAMA DEDA (fase 2)

Het project betreft de bouw van 3 klaslokalen voor een lagere school in de wijk Medina in Abéné, Senegal. Het project vormt de 2^e fase van een meerjarenproject dat onder de noemer "SAAMA DEDA" ("de toekomst maak je zelf") wordt uitgevoerd. In de volgende (3^e) fase (2021) wordt weer een fundering voor 3 klassen gemaakt. Daarop wordt minimaal 1 klaslokaal gebouwd. In de laatste (4^e) fase (2022) worden op deze fundering de laatste twee klassen gebouwd en een aparte lerarenkamer.

2. Oorsprong van het project.

De directeur van de lagere school Alonda Diabang in Abéné vertelde ons dat de school overvol is: van elk leerjaar zijn er 2 klassen met elk 60 à 70 kinderen. Het aantal geboortes is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat er veel meer klassen nodig zijn om aan de explosief stijgende onderwijsvraag te kunnen voldoen. Het is volgens de voorschriften niet mogelijk om op de huidige locatie nog meer klassen te bouwen.

Een nieuwe lagere school. Voorlopig in hutten van palmladeren

Ofschoon er geen geld was om klassen te bouwen heeft de ouderraad door de nood gedwongen toch besloten om in een andere wijk een nieuwe school te starten. De daarvoor aangestelde interim directeur kreeg de opdracht om de nieuwe locatie in te richten en op zoek te gaan naar donateurs voor de bouw van de vereiste klaslokalen. In afwachting daarvan maakte de ouderraad voor de klassen hutten van palmladeren. Deze bieden wel enige bescherming tegen de felle zon, maar geenszins goede leeromstandigheden. De leerkrachten doen hun uiterste best om er iets van te maken, maar lang kan de situatie niet blijven duren. Tijdens de lessen kruipen soms schorpioenen en slangen naar binnen en na elk regenseizoen zijn de hutten zo verwoest dat ze opnieuw moeten worden opgebouwd.



Stichting Bright Future for Children opgericht

Getroffen door deze nijpende situatie hebben we met een aantal betrokken mensen besloten om Stichting Bright Future op te richten om in Abéné lokale initiatieven te ondersteunen, die direct of indirect aan kansarme kinderen tegemoet komen. De stichting is opgericht in mei 2018. Onze naam bevat tevens onze missie: 'Bijdragen aan een beter toekomstperspectief voor kansarme kinderen'. De bouw van de vereiste klaslokalen voor de nieuwe lagere school in Abéné vormt ons eerste (meerjaren)project dat we onder de noemer SAAMA DEDA in samenwerking met een formeel geregistreerde lokale partner, de vereniging DECASA, realiseren. SAAMA DEDA betekent in de lokale taal, het Mandinka, "de toekomst maak je zelf". (Informatie over onze overige projecten treft u aan op onze website www.brightfutureforchildren.nl).

2019: Eerste 2 klaslokalen gerealiseerd

In de eerste fase van het project (2019), hebben we twee klaslokalen gebouwd op een fundering die in 2018 was gerealiseerd. De uitvoering van het project verliep naar volle tevredenheid. Het bouwresultaat kwam overeen met wat we beoogden. In financieel opzicht werd, door een goed lokaal projectbeheer, in vergelijking met de oorspronkelijke kostenramingen, € 945 minder uitgegeven.

Tabel 1. Financieel resultaat fase 1

Kostenraming fase 1	12.800
Werkelijke kosten	11.855
Resultaat	-945

Erkenning school

De school is in de loop van 2018 erkend door de Senegalese overheid. Er is een directeur toegewezen en voor de in werking zijnde klassen zijn (betaalde) leerkrachten aangesteld.

3. Probleemdefinitie

De sterke bevolkingsgroei in Abéné maakt het noodzakelijk om het aantal (lagere) scholen drastisch uit te breiden om aan de onderwijsvraag tegemoet te komen. De meeste (lagere) scholen in Senegal kennen overvolle klassen van ongeveer 70 kinderen, waardoor het niet mogelijk is om aan alle kinderen op een verantwoorde wijze onderwijs te kunnen bieden. Juist daarom spant de overheid zich ook in om het onderwijs te vernieuwen. De focus ligt nu op een activerende probleemgestuurde didactische aanpak. De onderwerpen, die bij de leefwereld van de kinderen aansluiten, worden in groepjes geanalyseerd en uitgewerkt. Zo worden veel meer kinderen op een actieve wijze bij de les betrokken.

4. Probleemoplossing

Ofschoon de nieuwe didactische aanpak beter is afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen, blijven toch de grote aantallen kinderen per klas een sterke wissel trekken op de leerkrachten. De 2^e focus ligt dan ook op de *klassenverkleining door uitbreiding van het aantal scholen*.

Volgens het beleid van de Senegalese overheid kan elke basisgemeenschap het initiatief nemen om met de hulp van een buitenlandse partner een school te bouwen. Al tijdens de bouwperiode wordt de school erkend. De erkenning houdt in dat een directeur en het vereiste aantal leerkrachten wordt aangesteld en dat de school wordt opgenomen in het reguliere staatstoezicht door de inspectie van onderwijs. Dit is ook het geval bij de lagere school waarop dit project betrekking heeft.

5. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de lagere schoolleeftijd en hun leerkrachten van Abéné, een dorp van de gemeente Kafountine in Zuid-Senegal. Ofschoon de school in de wijk Medina wordt gebouwd, is de school bestemd voor alle kinderen van Abéné. De bestaande lagere school kan wegens sterke bevolkingstoename de evenredig toegenomen onderwijsvraag niet meer opvangen.

6. Projectrealisatie

Het meerjarenproject SAAMA DEDA wordt gerealiseerd door:

Stichting Bright Future for Children

Stichting Bright Future for Children wil een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio Casamance in Zuid-Senegal. De stichting richt zich in het bijzonder op onderwijs en (beroeps-)vorming van jongeren om hen een goed toekomstperspectief te bieden. Alle leden van het bestuur hebben gedurende 15 jaar een intense band met het dorp Abéné, waar het project wordt gerealiseerd. Ze zetten zich vanuit deze verbondenheid in om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

Organisation pour le développement de la Casamance (DECASA)

DECASA is begin 2018 opgericht met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance. De aanleiding voor de oprichting was dat veel (zowel gesponsorde als niet gesponsorde) projecten niet goed gecoördineerd en gevolgd worden, waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in verwaarloosde staat bevinden. Ook werd vastgesteld dat er een gebrek aan kennis is om projecten op een adequate wijze te managen en te beheren.

DECASA wil, naast eigen ontwikkelingsinitiatieven, die uit sociologische onderzoek worden afgeleid, ook eigenaarschap en ondernemerschap bij anderen bevorderen door middel van training, begeleiding en coaching. DECASA wil een coördinerende rol vervullen om projecten onderling af te stemmen en met elkaar in verbinding te brengen. Het werkgebied zal zich over de jaren heen vanuit de gemeente Kafountine (waarvan het dorp Abéné een onderdeel uitmaakt) over de hele regio Casamance uitbreiden.

De ambitie is om zich over een aantal jaren zo ontwikkeld te hebben dat de organisatie in aanmerking komt voor het statuut van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie). Om het partnerschap met Stichting Bright Future for Children te formaliseren is een partnerschapsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een juridische basis verschaffen. DECASA heeft voor de realisatie een projectmanager benoemd, die zich zowel ten opzichte van DECASA als Stichting Bright Future for Children dient te verantwoorden.

De werktitel van het project "SAAMA DEDA" werd aangeleverd door DECASA. In deze werktitel wil DECASA tot uitdrukking laten komen dat het voor de ontwikkeling van het dorp / de regio van belang is om "de toekomst in eigen handen te nemen". (Buitenlandse) partners kunnen *tijdelijk* gewenste ontwikkelingen financieel ondersteunen, maar de gemeenschap zelf blijft verantwoordelijk voor de realisatie, de instandhouding en de verdere ontwikkeling ervan.

Verantwoordelijkheidsverdeling

Overeenkomstig de partnerschapsovereenkomst is Stichting Bright Future for Children verantwoordelijk voor de financiering van het project en dus ook voor de daarvoor benodigde fondsenwerving.

De vereniging Decasa van Abéné is lokaal verantwoordelijk voor de projectrealisatie en het daarbij horende projectmanagement. Decasa heeft één van haar leden als projectcoördinator aangesteld. Het is dezelfde persoon, die (naar volle tevredenheid) ook de realisatie van de 1e fase van het project coördineerde. (zie verder onder 8 'Projectorganisatie'). **DECASA (en de aannemer) hebben verzekerd dat de bouw binnen de begroting zal worden gerealiseerd.**

7. Projectplan: activiteiten, begroting, projectplanning, financieringsplan.

Dit projectplan betreft de 2^e fase van het meerjarenproject SAAMA DEDA. In de 2^e fase (2020) worden 3 klaslokalen gebouwd op een daarvoor bestemde fundering.

Projectplan en begroting

Tabel 2 Projectactiviteiten en begroting

Activiteiten	Begroot in €
Bouw 3 klassen	16.840

De bouwkosten zijn gebaseerd op de in de bijlage toegevoegde kostenraming. Deze werd begin 2019 ter plaatse door de secretaris van Stichting Bright Future for Children gecontroleerd en door het bestuur geaccordeerd. De aannemer en onze partner DECASA hebben ons verzekerd dat het project binnen de begroting zal worden gerealiseerd.

Projectplanning

Onderstaande tabel bevat de projectplanning

Tabel 3 Projectplanning

Projectplanning	2019			2020												2021	
	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
1. Fondsenwerving																	
2. Bouw fundering																	
3. Bouw klaslokalen																	
4. Ingebruikname klassen																	
5. Verantwoording realisatie																	

Van juli t/m september is in Senegal het regenseizoen. In deze periode is het nagenoeg niet mogelijk om te bouwen.

Financieringsplan

Tabel 4 Financieringsplan


Totale projectkosten	Op basis van offerte DECASA	€ 16.840 ⁽¹⁾
Fundering	Reeds bekostigd / gerealiseerd mei/juni	€ 2.625
Ter beschikking gesteld aan partner	T.b.v. bouw klaslokalen	€ 7.450
Beschikbaar vanuit donaties	Op bankrekening St. Bright Future	€ 2.850
Totaal		€ 12.925
Nog te financieren		€ 3.915
Gevraagde bijdrage		€ 3.000

(1) € 5.613 per klaslokaal

Als de financiering niet voor eind oktober 2020 rond komt zal de fondsenwervingsperiode worden verlengd en zal de bouw van de klaslokalen opnieuw enkele maanden worden uitgesteld.

8. Projectorganisatie, informatievoorziening en controle.

Voor de realisatie van het project de volgende projectorganisatie opgezet.

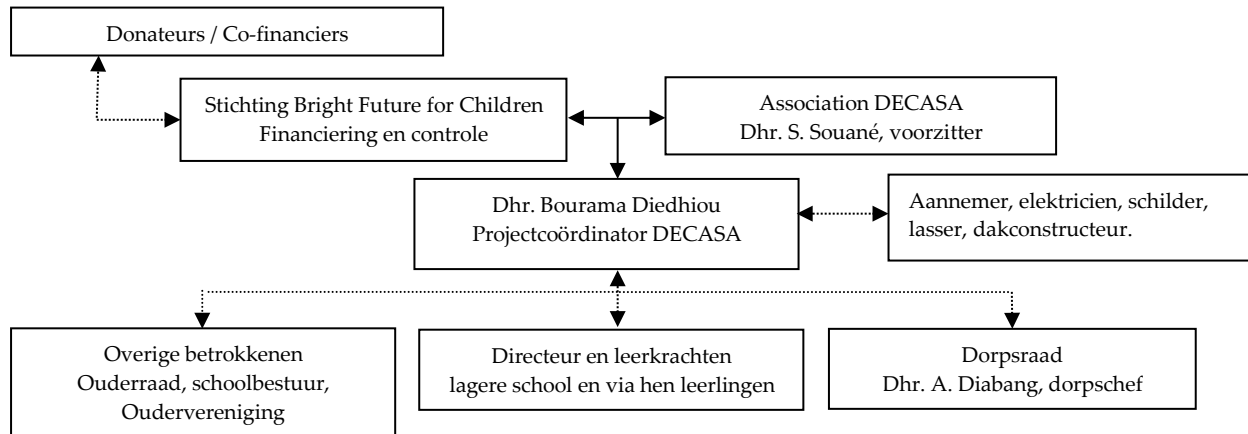

Actoren

1. Stichting Bright Future for Children en DECASA hebben in een partnerschapsovereenkomst vastgelegd dat ze zich zullen inspannen om in de wijk Medina een 2^e lagere school te bouwen om aan de stijgende onderwijsvraag te voldoen.
2. Stichting Bright Future for Children werft daartoe donateurs en fondsen van co-financiers en verantwoordt zich aan hen over de besteding van de ter beschikking gestelde fondsen.
3. Association DECASA heeft dhr. B. Diedhiou als lokale projectcoördinator aangesteld om het project te realiseren en de realisatie te beheren volgens de overeengekomen kostenraming en planning. Hij plant de diverse werkzaamheden in overleg met de personen die deze werkzaamheden uitvoeren. Hij ziet toe op de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden en verantwoordt zich over het realisatieproces en het resultaat zowel aan vereniging DECASA en aan Stichting Bright Future for Children.
4. De projectcoördinator informeert de dorpschef, de directeur en de overige betrokken organen. Alle betrokkenen kunnen hun mening geven over het project en aanvullende voorstellen doen. Deze worden door de projectpartners besproken en eventueel aan het meerjarenplan toegevoegd.

9. Projectcontrole

Stichting Bright Future for Children bezoekt minstens drie maal per jaar het project. Tijdens deze bezoeken vinden de volgende (controlerende) activiteiten plaats:

- Evaluatie partnerschapsovereenkomst;
- Fysieke controle en fotografie van gerealiseerde projectonderdelen;
- Financiële controle gerealiseerde projectonderdelen met onderliggende facturen en betalingsbewijzen;
- Planning nog te realiseren projectonderdelen;
- Voorbereiden van inhoudelijke en financiële verantwoordingen aan donateurs en co-financiers in Nederland en aan de dorpsraad en inwoners van Abéné;

Overige controle-elementen

De uitvoering van de werkzaamheden wordt ter plaatse gecontroleerd door dhr. Bourama Diedhiou, die door DECASA als lokale projectcoördinator werd aangesteld. Hij registreert alle betalingsverrichtingen in een kasboek. Het kasboek wordt na elke wijziging tezamen met bewijs leverende foto's naar de secretaris van Stichting Bright Future for Children gemaild. Daardoor zijn we steeds op de hoogte van de vorderingen en de financiële geldstromen.

De school is opgenomen in het staatstoezicht op het primair onderwijs en wordt in financieel opzicht ook intern gecontroleerd door het bestuur van de school (Comité de Gestion). Tevens beschikt de school over een ouderraad met instemmingsbevoegdheden.

Bijlage: kostenraming 3 klaslokalen

De hierna volgende kostenraming betreft bouw van 3 klaslokalen. De kosten zijn berekend in CFA, de lokale munteenheid. Subtotalen en eindtotaal zijn omgerekend naar €. De formele koers van de CFA is 1 € = 655,957. In de tabel is gerekend met 1 € = 655 CFA.

Terrassement					
1.	Fouille en rigoles	M3	26,4	2.000	52.800
2.	Remblais contre fondation	M3	3,264	2.000	6.528
Total terrassement					59.328
					€ 91,3
Gros oeuvres					
1.	Béton de propreté	M2	1,65	50.000	82.500
2.	Béton armé pour semelles	M3	3,255	110.000	358.050
3.	Soubassement	M2	66	7.000	462.000
4.	Béton armé chaînage en bas	M3	1,856	160.000	296.960
5.	Béton armé poteaux	M3	2,868	160.000	458.880
Total gros oeuvres					1.658.390
					€ 2.551,4
6.	Élévation agglos creuses	M2	330	5.500	1.815.000
7.	Béton armé chaînage lento	M3	1,856	160.000	296.960
8.	Dernière chaînage	M2	1,856	150.000	278.400
9.	Dallage sous sol	M3	15,12	60.000	907.200
10	Crépir int-ext.	M2	660	1.000	660.000
11	Remblais	M3	56,7	4.500	255.150
12	Chap. lise	M2	189	1.900	359.100
Gros oeuvres					4.571.810
					€ 7.033,6
Charpente					
1.	Chevrons 8/8	ml	105	4.000	420.000
2.	Chevrons 6/8	ml	258	3.200	816.000
3.	Litho	ml	300	1.500	450.000
4.	Tôles 0.23	M2	255	4.000	1.020.000
Total charpente					2.706.000
					€ 4.163,1
Menuiserie					
1.	Fenêtres		15	50.000	750.000
2.	Portes		3	100.000	300.000
Total menuiserie					1.050.000
					€ 1.615
	Peinture	forfait			450.000
	Électricité	forfait			450.000
Total forfait peinture + electricité					900.000
					€ 1.385
Totaalkosten 3 klassen				FCFA	10.945.528,0
					€ 16.839,3
