



BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

Tuinbouwproject Ussiyoola



Inhoudelijke en financiële eindrapportage


Realisatie door: Stichting Bright Future for Children
i.s.m. de vereniging DECASA van Abéné in Senegal

Inhoud: Ontginnen van een terrein voor tuinbouw door de GIE
Ussiyoola van de Karoninke gemeenschap in Abéné, Senegal

Doorlooptijd: januari 2024 t/m februari 2026 (25 maanden)

Algemene informatie

Land Stichting:	Nederland
Naam van de organisatie:	Stichting Bright Future for Children
Contact adres Stichting:	Houtstraat 14, 6001SJ Weert
Telefoonnummer:	06 51510474
E-mail :	info@brightfutureforchildren.nl
Website :	https://www.brightfutureforchildren.nl/
KvK:	Voorheen onder nr. 71717463 ingeschreven. Sinds 20-12-2025 uitgeschreven.
ANBI:	De stichting werd als ANBI aangemerkt.
Naam project:	Tuinbouwproject
Land projectuitvoering:	Senegal
Lokale partner:	Het project werd in samenwerking met de vereniging DECASA van Abéné gerealiseerd.
Begunstigden:	De GIE (Group of Economical Interest) Ussiyoola van de Karoninke gemeenschap in Abéné, Senegal.
Verantwoording:	Door intensivering van tuinbouwactiviteiten de inkomsten en het welzijn van de leden van de GIE Ussiyoola verhogen.
Financiering project:	Het project werd gefinancierd door ETWA en door Stichting Bright Future for Children op basis van inkomsten uit eigen acties en persoonlijke donaties
Projectlocatie:	Abéné, dorp van gemeente Kafountine in de regio Cassamance in Zuid-Senegal

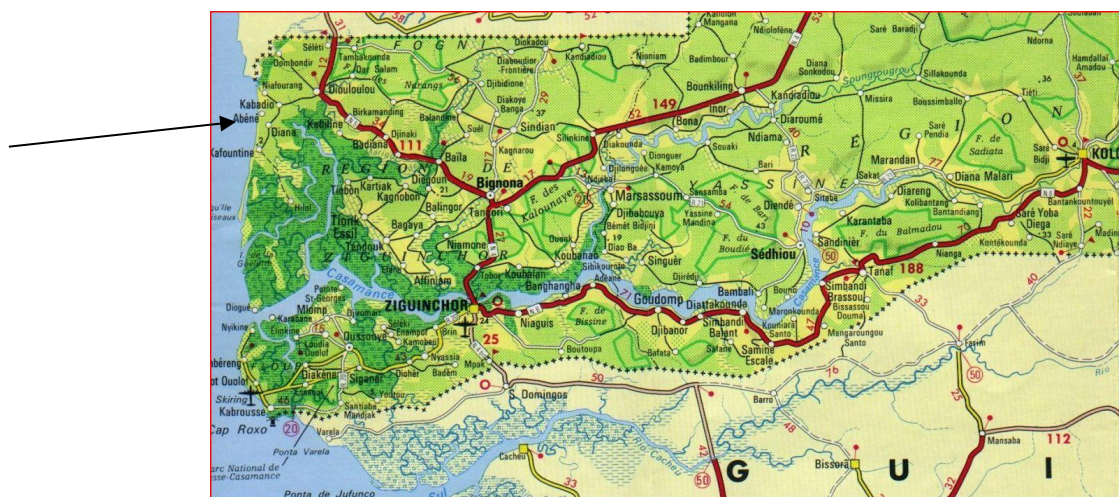

Inhoudsopgave

I.	Voorwoord	4
II.	Inhoudelijke eindrapportage	4
1.	Omschrijving van het project	5
2.	Chronologisch overzicht en beeldverslag realisatie	6
3.	Conclusie	9
III.	Financiële verantwoording	10

I. VOORWOORD

Het project Ussiyoola vormt het sluitstuk van de vele ontwikkelingsprojecten, die Stichting Bright Future For Children gedurende ruim 8 jaar in Abéné, Senegal uitvoerde in samenwerking met DECASA, haar lokale partner. ETWA verstreekte gedurende deze tijd meerdere malen een fonds om diverse van deze ontwikkelingsprojecten - waaronder het project Ussiyoola - mogelijk te maken en was daarmee onze trouwste fondsenverstrekker.

Dit laatste project was tevens het meest complex. Het kende een grillig verloop en had ruim twee maal de voorgenomen doorlooptijd. We hadden te maken met behoorlijk wat tegenslagen en onvoorziene problemen en kosten. De belangrijkste oorzaak was dat we de complexiteit van het project behoorlijk hadden onderschat. We waren er ten onterechte van uitgegaan dat we dit tuinbouwproject op een gelijkaardige wijze zouden kunnen realiseren als een tuinbouwproject, dat we eerder hadden uitgevoerd. Maar de ligging en aanwezige begroeiing van het te ontginnen terrein waren dermate complicerend en geldverslindend dat we genoodzaakt waren om het oorspronkelijke plan zowel qua inhoud als qua tijdsinvestering bij te stellen. Het was een harde les om te beseffen dat we hadden nagelaten om voorafgaand aan de acceptatie van de projectaanvraag de bestaande uitgangssituatie grondig te laten bestuderen.

De druk die op deze wijze de hele tijd op project heeft gelegen werd in februari 2026 verlicht toen we van de vereniging Ussiyoola vernamen dat de vereniging Kakolum uit Kafountine (gefinancierd door haar zusterorganisatie in Barcelona) de mogelijkheid wilde bieden om op een gedeelte van het door ons ontgonnen terrein een permacultuur moestuin te ontwikkelen. Voor de uitvoering, begeleiding en training in de praktijk van de leden van Ussiyoola was beroep gedaan op "Permafoodforest" een Duitse organisatie, die met succes in samenwerking met de Senegalese overheid in de regio al een viertal permacultuur moestuinen hadden ontwikkeld.

We waren meteen enthousiast over deze ontwikkeling omdat dit een zekere garantie biedt voor de continuïteit van het tuinbouwproject. We maakten dankbaar gebruik van de expertise van Permafoodforest, stemden investeringen op elkaar af en kregen zicht op de verdere tuinbouwactiviteiten op het terrein.

In deze rapportage geven we via een beeldverslag inzicht in het grillige verloop van dit project, dat we uiteindelijk met een gunstig toekomstperspectief hebben afgesloten.

II. INHOUDELIJKE EINDRAPPORTAGE

1. Omschrijving van het biologisch tuinbouwproject Ussiyoola.

Het biologisch tuinbouwproject had tot doel om de tuinbouwactiviteiten van Gie Ussiyoola zodanig te intensiveren dat daarmee de inkomsten en het welzijn van de leden van de GIE Ussiyoola kunnen worden verhoogd. De gie beschikte voor dat doel over een terrein van 2ha, waarvan, uit kosten oogpunt, ongeveer de helft werd geschikt gemaakt voor een gecombineerde teelt van groenten en fruit. Deze gecombineerde teelt levert niet alleen vruchten op voor de verkoop, maar biedt tevens tegen wind en felle zon bescherming aan de planten, die ertussen worden geteeld.

Aanleiding

De Casamance heeft een enorm tuinbouwpotentieel. Een gebrek aan (financiële) middelen, verzilting en een gebrek aan moderne technieken en kennis hebben geleid tot suboptimale benutting van het potentieel. In de regio Ziguinchor zijn gemeenschappen, die op traditionele wijze tuinbouw bedrijven, tot nu toe niet staat geweest om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel, waardoor het nodig is om extra groenten uit het Noorden in te voeren.

Eén van de doelen van onze locale partner DECASA is het stimuleren van lokaal eigenaarschap en ondernemerschap. Omdat het voorgenomen tuinbouwproject van de Gie Ussiyoola op deze doelstelling aansloot besloot DECASA om het project te ondersteunen en voor de financiering ervan een aanvraag in te dienen bij Stichting Bright Future for Children.

De aanvraag werd door Seny Souané, de voorzitter van DECASA, die op dat moment in Nederland verbleef, toegelicht tijdens de bestuursvergadering van 7 september 2023 en door het bestuur goedgekeurd. Omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren werd kort daarna bij ETWA een fonds aangevraagd voor de co-financiering van het project.

Doelgroep



De doelgroep van het project wordt gevormd door de Gie (*Group of Economical Interest*) Ussiyoola. Dit is een formeel geregistreerde tuinbouworganisatie van de Rooms-katholieke Karoninke gemeenschap van Abéné, die uit ongeveer 150 actieve mannen en vrouwen bestaat. De Gie wil ook jongeren, die van de Gie deel uitmaken, stimuleren om hun competenties te ontwikkelen, opdat ze in staat zouden zijn om lokale producten in de subregio te verkopen.

Projectdoelen

In de projectaanvraag, die we eind oktober 2023 indienden, benoemden we de volgende projectdoelen:

1. op biologische wijze groenten en fruit telen;
2. verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van de groenteopbrengst;
3. winstgevend maken van de tuinbouwactiviteiten;
4. verhogen van het inkomensniveau van de leden.

Voor de realisatie van deze doelen was het noodzakelijk om:

1. Het terrein geschikt te maken voor tuinbouw (verwijderen van struiken en bomen)
2. Het terrein te omheinen om loslopende dieren te weren;
3. Het terrein te voorzien van een watervoorzieningssysteem;
4. Zaden en werkmaterialen aan te schaffen.

Goedkeuring projectaanvraag

Begin november presenteerde onze penningmeester Hans Gertsen de projectaanvraag aan de ETWA commissie. Het project werd enthousiast onthaald en de gevraagde bijdrage van € 4.000 werd al op 11 december 2023 overgemaakt. Het resterende bedrag van (toenmalig) ingeschatte kosten (zijnde € 3.540,96) kon door Stichting Bright Future for Children worden bekostigd uit eerder ontvangen particuliere donaties. Daardoor was het mogelijk om het project in januari 2024 op te starten. De oorspronkelijke gedetailleerde kostenraming is opgenomen in de tabel onder de Financiële verantwoording in hoofdstuk III.

2. Chronologisch overzicht en beeldverslag projectrealisatie

In het navolgende overzicht doen we fasegewijs verslag van de projectrealisatie met inbegrip van de vele tegenslagen, vertragingen en onvoorziene zaken waarmee we te kampen hadden.

Januari 2024 - maart 2025



Het project werd in januari met een symbolische handddruk opgestart tijdens een overleg van onze penningmeester, Hans Gertsen, met vertegenwoordigers van de gie Ussiyoola en Seny Souané, de voorzitter van DECASA, die de rol van projectmanager op zich had genomen.

Kort daarna begonnen de leden van de gie Ussiyoola aan de voorbereidende grondwerkzaamheden (struiken, niet bruikbare bomen en onkruid verwijderen) om het terrein (2ha) geschikt te maken voor de tuinbouw.



Maar al snel bleek dat dit een te omvangrijk en te moeilijk werk was. Eerst moesten op het terrein (2ha) een grote hoeveelheid bomen met een kettingzaag worden verwijderd zodat daarna de stronken uitgegraven konden worden.

Gezien onze ervaring met een eerder uitgevoerd tuinbouwproject waren we er van uitgegaan dat het bedrag dat we hadden opgenomen voor het klaarmaken van terrein toereikend zou zijn en dat het uitgraven en verwijderen van de boomstronken door een groep mensen gedaan zou kunnen worden. Maar alle groepen arbeiders die hiervoor werden benaderd, sloegen de opdracht af omdat ze deze moeilijke en omvangrijke klus niet wilden uitvoeren voor de vergoeding die we hen konden bieden. Daarom werd in overleg met de gie Ussiyoola besloten om een bulldozer in te huren voor het uitgraven en verwijderen van de boomstronken en struiken.



Herziening begroting

Door deze beslissing en de meerkosten door de huur van een bulldozer waren we genoodzaakt om de oorspronkelijke begroting te herzien. In overleg met de gie Ussiyoola werd besloten om de verdere ontwikkeling van het terrein tot de helft (1 ha) te beperken, de tuinbouwgereedschappen en zaden met de helft te verminderen en het projectmanagement niet te bekostigen. De overige onderdelen werden gehandhaafd omdat ze essentieel waren voor het project. In hoofdstuk III is in de tabel onder "Herziene budget" te zien dat de herziening, ondanks de bezuinigen toch meer kosten zou opleveren. In een brief waarin we ETWA over deze ontwikkeling op de hoogte brachten informeerden we dat we de meerkosten (i.c. € 1.313) uit eigen middelen aan het budget zouden toevoegen.

Groot tijdverlies

De volgende ontwikkelingen maakten dat het project tot eind maart 2025 veel vertraging opliep:

- Door de politieke onrust rondom de presidentsverkiezingen begin 2024 moest tot medio maart 2024 gewacht worden met het afzagen van de bomen en struiken op het terrein. Deze zeer omvangrijke werkzaamheden konden pas medio mei 2024 worden afgerond.
- De onderhandelingen en de besprekingen met groepen arbeiders en de vereniging Ussiyooola over de grondwerken en het aanvragen van een offerte voor een bulldozer hebben de 3 maanden tijd gevraagd.
- Ondertussen was het regenseizoen (augustus t/m november 2025) begonnen. In die periode was het niet mogelijk om het terrein met voertuigen te betreden. Omdat het terrein zich in een lager gelegen deel van het dorp bevindt komen de toegangswegen dan lange tijd onder water te staan.
- De afspraak dat de bulldozer naar Abéné zou komen werd herhaaldelijk op het laatste moment afgezegd wegens technische problemen, achterstand in werkzaamheden en het niet beschikbaar zijn van een oplichter voor het vervoer van de bulldozer vanuit Ziguinchor naar Abéné (70 km).

Maart - november 2025

Op 26 maart 2025 arriveerde eindelijk, met ongeveer 7 maanden vertraging, de bulldozer om de struiken en stronken op het terrein te verwijderen.



Na twee dagen waren de onbruikbare bomen en struiken verwijderd en was het terrein genivelleerd.

Een week later werd een groep jongeren benaderd om het omheiningsgaas te bevestigen aan de hardhouten palen die het terrein afbakenen. Om het werk te verduidelijken werd eerst de omtrek van het terrein afgelopen. Daarna werden de palen waaraan het omheiningsgaas werd bevestigd rechtgezet, hersteld of aangevuld. Om voldoende werkruimte te hebben werden de struiken aan beide kanten van de omheining verwijderd.



Begin juni werd het omheiningsgaas aan de palen bevestigd. Het was, door de grote oppervlakte van het terrein een omvangrijke klus. Kort daarna brak het nieuwe regenseizoen aan waardoor de werkzaamheden tot eind oktober moesten onderbroken worden.

Nog meer aanvullende kosten

Ondertussen was ook duidelijk geworden dat de kosten voor het herstellen van de metalen toegangspoort en voor het herstellen van de waterbasins niet in de begroting waren opgenomen. Ook drong de gie Ussiyooola erop aan om het gaas te verstevigen met prikkeldraad. Men vreesde namelijk dat de aangebrachte omheiding niet afdoende zou zijn om loslopend vee te weren. Tot slot werd verzocht om de mannen en vrouwen, die het terrein zouden bewerken 6 maanden in de praktijk te begeleiden bij het toepassen van moderne tuinier-technieken. Omdat de hiervoor benodigde middelen beschikbaar waren besloot het stichtingsbestuur om aan deze aanvullende behoeften en wensen tegemoet te komen (zie tabel 'Financial result' in de Financiële verantwoording onder hoofdstuk III).

De toegangspoort werd eind november hersteld en in dezelfde periode werd ook de omheining verstevigd met prikkeldraad. Gedurende het regenseizoen werden er op het terrein rijstplantjes opgekweekt. Deze werden daarna in de rijstvelden uitgeplant.



December 2025 - februari 2026

In december 2025 werd duidelijk dat de gie Ussiyoola bij de vereniging Kakoloum uit Kafountine een aanvraag had ingediend om op een gedeelte van het terrein een permacultuur moestuin te ontwikkelen. Omdat de goedkeuring van deze aanvraag consequenties zou hebben voor de nog uit te voeren projectactiviteiten werd besloten om de besluitvorming hierover af te wachten.

In februari 2026 vernamen we dat de Spaanse zusterorganisatie van de vereniging Kakoloum besloten had om de aanvraag goed te keuren en een fonds ter beschikking te stellen. Voor de uitvoering van het project werd inclusief de 6 daagse praktijktraining onder de noemer Tolou Keur beroep gedaan op "Permafoodforest" een Duitse organisatie, die in samenwerking met de Senegalese overheid al een viertal permacultuur moestuinen in de regio had ontwikkeld.

Omdat deze ontwikkeling een zekere garantie bied voor de continuïteit van het tuinbouwproject reageerden we hier meteen enthousiast op. Omdat er bij de investeringen voor de watervoorziening sprake was van een zekere overlap tussen onze activiteiten en die van het permacultuurproject verdeelden we de investeringen.

Stichting Bright Future for Children financierde de installatie voor het oppompen van water, de waterpomp en het herstel van de waterbasins.



De vereniging Kakoloum plaatste de reeds beschikbare zonnepanelen, bouwde een watertoren voor de watervoorziening van 5 over het terrein verspreide waterkraantjes en integreerde een druppelsysteem in de permacultuur-moestuin. Het centrum van deze moestuin wordt gevormd door een rond nachtverblijf voor 12 kippen en 2 hanen. Vanaf dit nachtverblijf kunnen de kippen onder een overdekte "tunnel" naar een buitenverblijf. De mest van de kippen wordt met tuinafval en bladeren vercomposteerd. Rondom het nachtverblijf van de kippen zijn in een viertal cirkels bedden aangelegd voor de groententeelt. In de bedden is een druppelsysteem aangebracht om de planten continu van water te voorzien.





Over de rest van het terrein werden ongeveer 400 fruit en loofbomen geplant. De loofbomen dienen om het terrein tegen wind te beschermen en tussen de fruitbomen zullen bedden worden ingericht voor de groententeelt. Bij de verdeling van deze bedden over de mannen en vrouwen die er groenten zullen telen zal ook hun begeleiding worden opgestart en als nazorg nog tot juni 2026 doorlopen.



We besloten op advies van de begeleiders van Permafoodforest om op het resterende deel van het terrein geen druppelsysteem meer aan te leggen omdat er met 2 waterbasins en 5 over het terrein verspreide waterkraantjes voldoende mogelijkheid zijn om de planten met gieters water te geven en er volgens hen ook een grote kans bestaat dat ratten de waterslangen van het druppelsysteem doorbijten. Door de financiële ruimte die daardoor ontstond werd besloten om de eerdere bezuiniging op de de zaden teniet te doen en op verzoek van de gie Ussiyoola de aanschaf van de tuinbouwgereedschappen te beperken tot gieters, schoffels en kruiwagens aangezien ze zelf voor de andere gereedschappen konden zorgen. Deze wijzigingen worden inzichtelijk gemaakt onder “Final financial result” in de financiële verantwoording onder hoofdstuk III).

III. Conclusie

Uit het voorgaande (beeld)verslag blijkt dat de realisatie van het tuinbouwproject een zeer grillig en vaak frustrerend verloop kende. Steeds opnieuw moest worden geanticpeerd op verwachte en onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen. Er werd veel creativiteit gevraagd van de projectmanager om het project tot een goed einde te brengen. Door het project van de vereniging Kakolum te integreren waren we in staat om het project met een goed toekomstperspectief met 14 maanden vertraging uiteindelijk af te sluiten

IV. FINANCIAL REPORT

Horticultural equipment	Quantity	Original budget			Revised budget			Final financial result		
		UP FCFA	Tot. FCFA	Total €	Quant	FCFA	€	Quant	FCFA	€
Nozzle 15 litres	1	60.000	60.000	91,47	1	60.000	91,47			
Watering cans 10 litres	50	6.000	300.000	457,34	20	120.000	182,94	100	600.000	914,69
Buckets 10 litres	50	800	40.000	60,97	20	16.000	24,39			
Shovels	5	3.000	15.000	42,87	3	9.000	13,72			
Tapeline	2	5.000	10.000	15,24	1	5.000	7,62			
Role of rope	1	1.000	1.000	1,52	1	1.000	1,52			
Wheel barrow	2	25.000	50.000	76,22	1	25.000	38,11	2	60.000	91,47
Rakes	5	3.000	15.000	22,87	3	9.000	13,72			
Spuds	50	1.000	50.000	76,22	20	20.000	30,49	100	100.000	152,45
Measuring rods	4	1.500	6.000	9,15	2	3.000	4,57			
Plant sticks	50	1.100	55.000	83,85	20	22.000	33,54			
Crates	20	4.000	80.000	121,96	10	40.000	60,98			
Plant scoops	50	1.200	60.000	91,47	20	24.000	36,59			
Totale matériaux			742.000	1.131,17	Total	354.000	539,67	Total	760.000	1.158,61
Investments	Quantity	UP FCFA	Tot. FCFA	Total €	Quant	FCFA	€	Quant	FCFA	€
Terrain	2 ha	0	0	0	2ha	0	0	2ha	0	0
Aménagement terrain	2 ha	250.000	500.000	762,25				2ha	500.000	762,25
Removal trees chainsaw					1x	500.000	762,25	1x	500.000	762,25
Strump removal bulldozer					1x	1.000.000	1524,49	1x	1.000.000	1524,49
Transport bulldozer					2x	600.000	914,69	2x	600.000	914,69
Fence (wire mesh)	576 m	2.000/m	1.152.000	1.756,21	576m	1.152.000	1.756,48	576m	1.140.000	1.737,92
Straghtening fence									120.000	182,94
Plant drip system	1	1.500.000	1.500.000	2.286,74	1	1.500.000	2.286,74	1	0	0,00
Panneaux solaires	6	Already financed			6	0	0	6	0	0
Submersible pump	1	300.000	300.000	457,35	1	300.000	457,42	1	300.000	457,35
Drill installation	1	250.000	250.000	381,12	1	250.000	381,12	1	250.000	381,12
Metal doorgate								1	285.000	434,48
Rehabilitation basins								2	90.000	137,20
Supervision 50 persons									459.169	700,00
Totale investments			3.702.000	5.643,67		5.302.000	8.083,18		5.244.169	7.994,68
Budget seeds	Quantity	UP FCFA	Tot. FCFA	Total €	Quant	FCFA	€	Quant	FCFA	€
Onion	2 pots	30.000	60.000	91,47	1 pot	30.000	45,73	2 pot	60.000	91,47
Bitter eggplant	3 pots	7.000	21.000	32,01	2 pots	14.000	21,34	3 pots	21.000	32,01
Sweet eggplant	3 pots	14.000	42.000	64,03	2 pots	28.000	42,69	3 pots	42.000	64,03
Paprika (sweet pepper)	3 pots	6.000	18.000	27,44	2 pots	12.000	18,29	3 pots	18.000	27,44
Pepper	2 pots	29.000	58.000	88,42	1 pot	29.000	44,21	2 pots	58.000	88,42
Tomato	2 pots	29.000	58.000	88,42	1 pot	29.000	44,21	2 pots	58.000	88,42
Gombo	1 pot	10.000	10.000	15,24	1 pot	10.000	15,24	1 pot	10.000	15,24
Totale budget seeds			267.000	407,03		152.000	231,72		267.000	407,04
Overall total			4.711.000	7.181,87		5.808.000	8.854,58		6.271.169	9.560,33
Project management	5%		235.550	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Final total			4.946.550	7.540,96	Final	5.808.000	8.854,24	Final	6.271.169	9.560,33

The actual costs were € 2.019,37 higher than the initial cost estimate.

Invoices and proofs of payment (1 euro = 655,957 fcfa)				
Nr.	Beneficiary	Designation	Total in FCFA	Total in €
Invoice 379	Quincaillerie Générale	Arrosoirs, houes, brouettes	760.000	1.158,60
Invoices 380	Quincaillerie Générale	Pompe, grillage, fil barbelés, galvafil	1.440.000	2.195,27
Invoice 378	Quincaillerie Générale	semences	267.000	407,04
Proof Payment 1	Abdou Djiba	Aménagement 2ha	500.000	762,25
Proof Payment 2	Moussa Barry	Transport bulldozer + dessouchage	1.600.000	2.439,18
Proof Payment 3	Moussa Diabang	Terrassement 1a la tronçonneuse	500.000	762,25
Proof Payment 4	Matar Diabang	redressement grillage	120.000	182,94
Proof Payment 5	Boubacar Bâ	installation mini forage	250.000	381,12
Proof Payment 6	Daouda Bassène	Portail terrain / porte métallique	285.000	434,48
Proof Payment 7	Youssouph Coly	Réhabilitation bassins eau	90.000	137,20
Proof Payment 8	Eder Tendeng	Encadrement jardiniers Ussiyoola	459.169	700,00
			6.271.169	9.560,33

For non-formally registered suppliers/workers, proof of payment has been issued for delivered services.

	Financing	Amount
1.	ETWA	4.000,00
2.	Stichting Bright Future for Children (private donations)	5.560,33
		9.560,33
